



COMUNE DI IMPERIA · SETTORE LLPP E GRANDI OPERE

PNRR a Imperia: i cantieri raggiungono gli obiettivi, molti in anticipo

19 interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per **€ 51.279.169** complessivi (di cui **€ 34.513.516** di quota PNRR): il **95,5%** è già concluso, con piena adesione ai target fissati dal Ministero.

9 cantieri hanno chiuso in anticipo rispetto al cronoprogramma: i target sono già stati raggiunti e formalmente documentati sulla piattaforma ReGIS, a conferma della capacità dell'Amministrazione di programmare e accelerare l'attuazione degli interventi.

Altri **8 cantieri** hanno completato i lavori nei termini previsti: la relativa documentazione di chiusura sarà caricata sul portale ministeriale entro il 5 luglio, a perfezionamento dell'iter amministrativo.

17/19

INTERVENTI CONCLUSI

95,5%

TARGET RAGGIUNTI

I restanti **2 interventi** (Asilo nido di Frazione Piani e Programma PINQUA) sono in fase di ultimazione, nell'ambito di una proroga regolarmente autorizzata dal Ministero: su € 51.279.169 complessivi finanziati, residuano da completare circa **€ 2.300.000** (€ 300.000 per l'asilo nido, € 2.000.000 per il PINQUA). Nessuna criticità: i cronoprogrammi aggiornati sono pienamente rispettati.


| INTERVENTO | FINANZIAMENTO TOTALE |
|---|----------------------|
| CONCLUSI IN ANTICIPO | |
| Nuova Costruzione Asilo Nido e Servizi di Educazione e Cura per la Prima Infanzia Via Vecchia Piemonte | € 2.386.534 |
| Palestra Maggi Via Silorata 18 Adeguamento Impianti e Interventi su Strutture | € 990.000 |
| Porzione di Immobile Comunale Polivalente | € 1.093.000 |
| Cittadella Dello Sport N. Ciccione -m5-c2-i 3.1 - Cluster 1 - Interventi di Nuova Costruzione di Campo da Padel, Bocce, Attrezzi Corpo Libero | € 1.644.500 |
| Plesso Scolastico di Via Gibelli Miglioramento Sismico e Efficientamento Energetico | € 1.099.000 |
| Campo di Atletica Comunale A. Lagorio Pista Coperta | € 1.455.000 |
| Campi San Lazzaro Lungomare Vespucci Sport All'aperto | € 803.000 |
| Riqualificazione Porzione Fabbricato Ex-salso per Esposizioni e Manifestazioni | € 485.000 |
| Civico Teatro Cavour Via F. Cascione Riqualificazione Facciate | € 790.000 |
| CONCLUSI NEI TERMINI | |
| Riqualificazione Ex Albergo Stazione di Posta Emergenze Abitative | € 710.000 |
| Case Parcheggio di Via G. Airenti Via G.airenti, Località Piani Interventi di Manutenzione Straordinaria | € 1.700.000 |
| Riqualificazione Ex Albergo Italia e Riconversione ad Attività Sociali ed Inclusive | € 2.460.000 |
| Edificio Scolastico Piazza Calvi Realizzazione di Lavori di Manutenzione Straordinaria | € 4.750.000 |
| Stazioni di Posta Due Alloggi Caramagna Delocalizzato Ampliamento Casa Don Glorio | € 1.090.000 |
| Servizi di Assistenza, Domotica, Riqualificazione e Allestimento di Un Alloggio per L Autonomia delle Persone con Disabilità e Servizi Connessi Presso Albergo Italia | € 715.000 |
| Nuova Rete di Percorsi Ciclabili Territorio Comunale Realizzazione di Nuovi Tratti di Percorsi Ciclabili Collegati con Lareria | € 2.400.000 |
| Infrastruttura Intelligente Ecologica a Guida Autonoma su Area Costiera da Levante a Ponente | € 5.900.500 |
| IN ULTIMAZIONE (PROROGA AUTORIZZATA) | |
| Nuova Costruzione Asilo Nido e Servizi di Educazione e Cura per la Prima Infanzia Frazione Piani Imperia residuano circa € 300.000 da completare | € 4.180.000 |
| Pinqua — Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (3 interventi) residuano circa € 2.000.000 da completare | € 16.627.636 |
| Totale 19 interventi | € 51.279.169 |



I risultati in numeri

Una fotografia sintetica dello stato di avanzamento dei 19 interventi PNRR del Comune di Imperia.

95,5% CONCLUSO

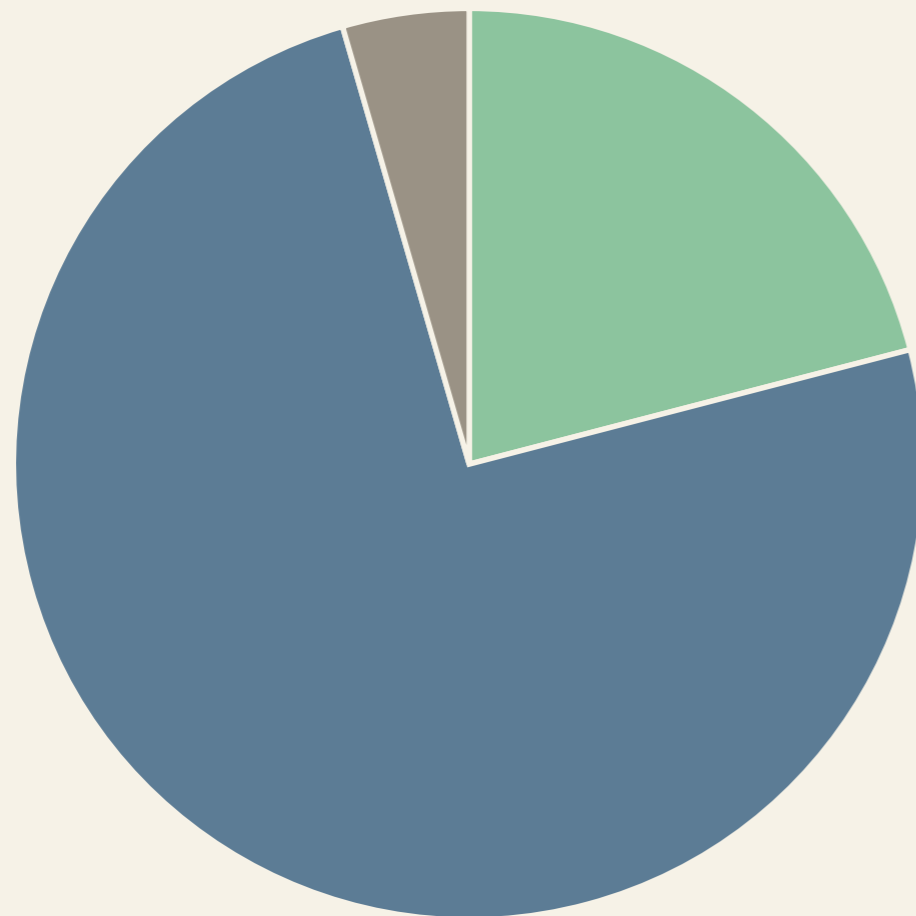

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ● Conclusi in anticipo | 9 interventi – € 10.746.034 |
| ● Conclusi nei termini | 8 interventi – € 19.725.500 |
| ● <i>In ultimazione (proroga)</i> | € 2.300.000 da completare |

Fonte: Ufficio Tecnico LLPP

elaborazione Settore LLPP e Grandi Opere

Risorse mobilitate per esito

Conclusi in anticipo € 10.746.034



Conclusi nei termini € 19.725.500



In ultimazione proroga autorizzata



17 cantieri su 19 hanno già raggiunto e documentato il proprio target PNRR. Gli ultimi due interventi procedono regolarmente entro le proroghe ministeriali, senza alcuno scostamento dal cronoprogramma autorizzato.

I target raggiunti in anticipo riguardano in prevalenza l'edilizia scolastica e sportiva; i cantieri conclusi nei termini comprendono il sistema Stazioni di Posta e la mobilità sostenibile. La chiusura amministrativa dei due interventi residui è prevista entro la proroga ministeriale.
